

MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Situation des programmes Synergie

Le point sur les chantiers

Evolution des stratégies de mise en production 2018

Travaux dans Osiris


PÉRIMÈTRE SYNERGIE

- 2 programmes 2014-2020 :
 - - 1 programme FEDER/FSE avec autorité de gestion Région
 - - 1 programme FEDER/FSE avec autorité de gestion Préfecture dont le FEDER est suivi dans Synergie
- - La partie FSE du programme FEDER/FSE Etat St Martin est suivi dans MaDemarcheFSE qui se déverse dans le SIFA pour la certification et la déclaration de dépenses .

SITUATION DES PROGRAMMES SYNERGIE

- - Aujourd'hui 956 opérations FEDER/FSE sont saisies dans le logiciel dont 607 sont programmées pour le PO du Conseil régional.
 - - 59 opérations FEDER sont saisies dont 22 sont programmées pour le PO Etat Saint-Martin
- Un total de 82 Certificats de service fait (CSF) validés par l'autorité de certification (AC) tout PO confondus soit 35 M€ de dépenses comptabilisées dans Synergie.

SITUATION DES PROGRAMMES SYNERGIE

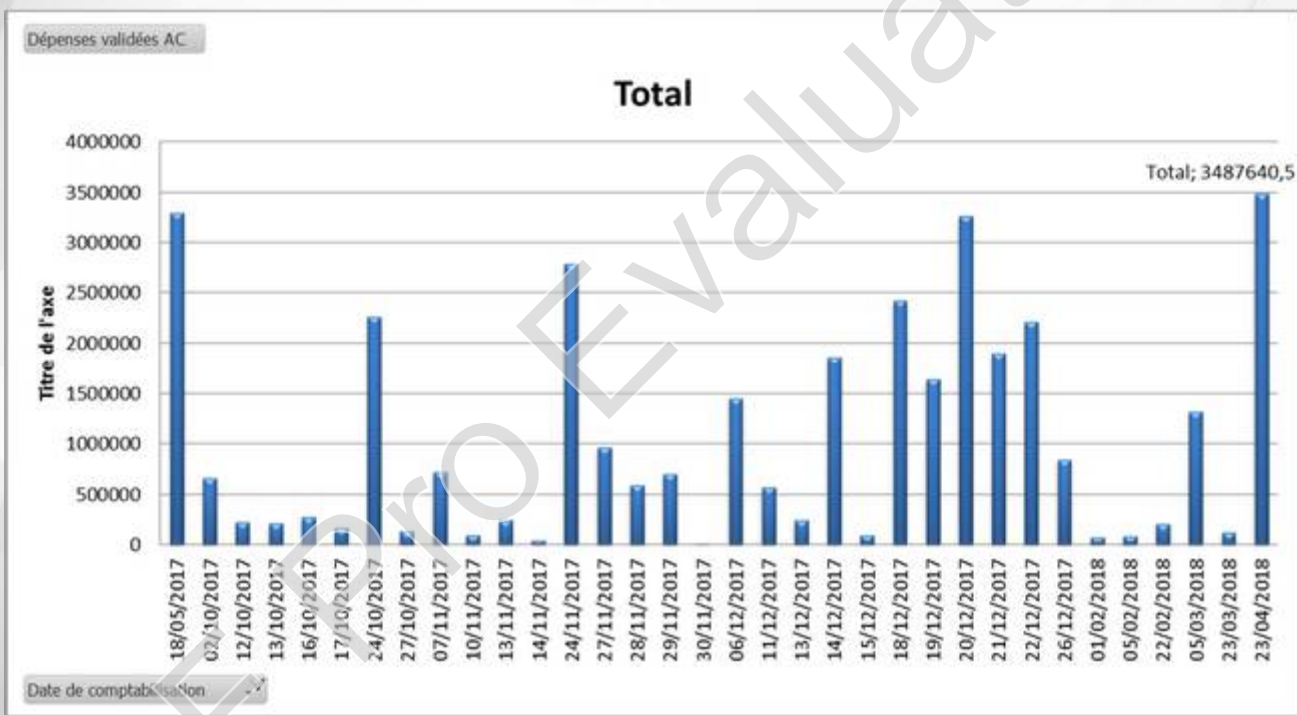

DEPLOIEMENT DE SYNERGIE

- Depuis les 1ère versions de Synergie à aujourd'hui :
 - Formation des utilisateurs sur la partie dépôt/programmation/certification
 - Accompagnement individualisé des utilisateurs lors de la saisie de leur 1er dossier (services instructeurs) et des permanences Synergie.
 - Création des documents types régionaux et diffusion des guides d'utilisation pour ces derniers
 - Information des gestionnaires sur les évolutions/corrections via des réunions régulières (suivi des tickets dans la helpdesk GPLI de la collectivité)

Situation des programmes Synergie

Le point sur les chantiers

Evolution des stratégies de mise en production 2018

Travaux dans Osiris

Charge Codage et Test Unitaires prestataires
(RTU) planifiée répartie par trimestre/mois de
livraison du chantier associé.

Cette représentation permet d'évaluer l'effort de
recette métier à mettre en œuvre par les
utilisateurs (10% environ)

T1 2018 : 80,8j
RTU

T2 2018 : 483,1j
RTU

Juillet : 36,5j
RTU

Août : 56j
RTU

Septembre
: 122,6j
RTU

Charge RTU planifiée* :

- Semestre 1 - Chantiers Synergie : 563,9 jours
- Semestre 1 - Evo unitaires & DDT : 68,7 jours
- Semestre 2 - Chantiers Synergie : 281,2 jours

Situation des programmes Synergie

Le point sur les chantiers

Evolution des stratégies de mise en production 2018

Travaux dans Osiris

- Principes généraux:

- Le planning de mise en production est « désynchronisé » du planning de développement
 - Le planning de production est construit autour de la saturation des ressources de développement (en fonction des expressions de besoin disponibles)
 - Le planning de mise en production est construit autour de la cohérence des fonctionnalités mises en œuvre pour assurer un service de bout en bout (ex: mise en place coordonnée PORTAIL + CDM)
- Il est souhaitable de minimiser le nombre de mises en production (paliers) pour minimiser les perturbations du service sous condition de mettre en place des protocoles de tests et recette rigoureux préalablement à la mise en production
- Les « petites évolutions » ne s'inscrivent pas dans cette logique de palier

- Principes généraux:
 - La recette se fait dans un cadre organisé (atelier), planifié et dans un délai contraint:
 - Présentation de la solution par la Maîtrise d'Œuvre,
 - Exécution de protocoles de recette construits préalablement par les référents sur la base des expressions de besoin et spécifications détaillées,
 - Disponibilité de la Maîtrise d'œuvre pour traiter au plus vite les incidents rencontrés
 - Idéalement:
 - 1 session de recette (5 jours maxi),
 - 1 période de correction des incidents (5 jours maxi),
 - 1 session de recette + GO MEP.
 - Les dates des recettes seront publiées au plus tôt après le COMET pour permettre la préparation des protocoles et l'identification des acteurs concernés.

- Compte tenu:
 - Des travaux de développement réalisés, en cours ou à venir (cf planning)
 - Du besoin de disposer d'un environnement Synergie le plus disponible possible
- La stratégie de mise en production 2018 est organisée autour de 2 paliers dont le contenu est décrit ci-dessous (à valider en COMET)
 - Fin Juillet 2018

Somme de charge			ETAT AVANCEMENT	Date livraison	Total
MODULE	Nom Chantier	Dossier			
■ Agrégateur	■ Tableau de pilotage Aco CGET	■ EVOLUTION TABLEAU AGR 4.1.10 Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention	■ 5-SFD EN COURS	13/06/2018	2
	■ Tableau de pilotage AG PO régionaux	■ DEGAGEMENT D'OFFICE Tableau de Gestion du dégageement d'office	■ 1-A RECETTER	17/11/2017	4
		■ Nouveau TABLEAU LISTE DES DDP	■ 1-A RECETTER	21/11/2017	2
		■ TABLEAU DE PILOTAGE PO Régionaux ARACHNE V2 MeP conditionnée par flux XML	■ 1-A RECETTER	26/02/2018	8
		■ TABLEAU DE PILOTAGE PO Régionaux TABLEAU DE SUIVI DES AF	■ 5-SFD EN COURS	06/06/2018	6
		■ TABLEAU DIRECTEUR EUROPE EVOLUTION	■ 2-A LIVRER	09/05/2018	8
		■ TABLEAU LISTE CSF Ajout d'un champ	■ 1-A RECETTER	18/04/2018	1
		■ TABLEAU LISTE CSF EVOLUTION	■ 1-A RECETTER	18/04/2018	9
	■ Tableau de pilotage DGFIP (dée CEZA)	■ Tableau de pilotage DGFIP (dée CEZA)	■ 5-SFD EN COURS	18/07/2018	12
■ CDM	■ Gestion dossier après conventionnement	■ CLOTURE OPERATION achèvement financier et plan de financement	■ 2-A LIVRER	29/06/2018	68
	■ Indicateurs & RAMOs	■ RAF SUR INDICATEURS ET EXPORTS PARTICIPANTS Y COMPRIS INDICATEUR PROGRAMME + FLUX F12 - LOT P1	■ 1-A RECETTER	26/04/2018 3.20.0	59
		■ RAF SUR INDICATEURS ET EXPORTS PARTICIPANTS Y COMPRIS INDICATEUR PROGRAMME + FLUX F12 LOT P2	■ 1-A RECETTER	26/04/2018 3.20.0	41
	■ Optimisation CDM	■ OPTIMISATION CDM attente définition périmètre lot 1 - URGENT	■ 4-SFD A VALIDER	29/06/2018	42
■ portail	■ Evolutions portail	■ Portail EVOLUTION priorisation AG atelier 20 Octobre 2017 P3	■ 2-A LIVRER	25/05/2018	69
■ SIFA	■ Corrections	■ Corrections financières hors forfaitaire, extrapolé et rectificative - exclusion de périmètre	■ 2-A LIVRER	31/05/2018	58
		■ Corrections financières hors forfaitaire, extrapolé et rectificative - comptabilisation en masse	■ 2-A LIVRER	31/05/2018	18
	■ Signalement OLAF	■ SIGNALEMENT OLAF - partie IMS	■ 2-A LIVRER	31/05/2018	100
■ Transverse	■ Chantiers TECHNIQUES	■ ALIMENTATION AGREGATEUR	■ 1-A RECETTER	19/04/2018	7
		■ PERFORMANCE	■ 3-A PLANIFIER	24/05/2018	9
Total général					521

- Fin Octobre 2018 (A ajuster en fonction des travaux à venir)

Somme de charge			ETAT AVANCEMENT	Date livraison	Total
MODULE	Nom Chantier	Dossier			
■ CDM	■ Circuit de gestion	■ CIRCUIT DE GESTION lier un circuit spécifique à une codification	■ 6-SFD A REALISER	12/07/2018	25
	■ Indus et recouvrements	■ INDUS ET RECOUVREMENT	■ 4-SFD A VALIDER	27/09/2018	125
	■ Optimisation CDM	■ CORRECTIONS FINANCIERES Impact irrégularité et corrections financières sur CDM (retour Flux F4 et F8) - URGENT	■ 5-SFD EN COURS	08/08/2018	42
■ Partenaires	■ ADAPTATION FAMI	■ INTEGRATION FAMI/FSI partie CDM	■ 5-SFD EN COURS	23/08/2018	56
■ portail	■ Evolutions portail	■ Portail EVOLUTION priorisation AG atelier 20 Octobre 2017 P4	■ 5-SFD EN COURS	20/07/2018	50
Total général					298

Situation des programmes Synergie

Le point sur les chantiers

Evolution des stratégies de mise en production 2018

Travaux dans Osiris

OUTILS OSIRIS

- Sur les 44 mesures du PDR Guadeloupe, la majeure partie des outils soit 41 sont mis en production et disponible pour l'instruction des dossiers dans Osiris
- Reste 3 outils en cours de déploiement; principalement pour le traitement des dossiers des GALs.

SYNTHÈSE DES DOSSIERS PROGRAMMÉS

Répartition par SI			
Étiquettes de lignes	Nb de dossiers programmés	Mt FEADER programmé	Nb de dossiers payés
DAAF	4901	46 390 574,58	3698
REGION	36	19 812 251,16	2
Total général	4937	66 202 825,74	3700
Répartition par outil de gestion			
Étiquettes de lignes	Nb de dossiers programmés	Mt FEADER programmé	Nb de dossiers payés
ISIS	2938	2 896 834,00	2906
OSIRIS	1999	63 305 991,74	794
Total général	4937	66 202 825,74	3700

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
